

B3

V4.0012530

reg.nr.:
procesverantw.: 13150

PARK LINGEZEGEN
MOOI DICHTBIJ!

INGEKOMEN
11 NOV. 2014
GEMEENTE NIJMEGEN

class.nr.:
afgedaan:

Gemeente Nijmegen
T.a.v. de leden van de Raad
Postbus 9105
6500 HG NIJMEGEN

Uw brief van
--

Uw kenmerk
--

Ons kenmerk
20141107-012/lr

Datum
7 november 2014

Onderwerp
Stand van zaken

Behandeld door
J.W. Kamerman

Telefoonnummer
088 0109333

Bijlage(n)
1

Geachte Leden van de Raad,

Hierbij ontvangt u ter kennisgeving de stand van zaken van de gemeenschappelijke regeling Park Lingezegen.

Met vriendelijke groet,
Namens het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen,
De Parkdirecteur,



J.W. Kamerman

Kopie: -Archief Park Lingezegen



Stand van zaken

zomer 2014



VOORWOORD


Park Lingezen is een landschapspark in wording en omvat het groene gebied tussen Arnhem, Nijmegen, Lingewaard en Overbetuwe. Het landschapspark bestaat uit vijf deelgebieden: De Park, Het Waterrijk, Het Landbouwwand, De Buitens en De Woerd. Elk deelgebied heeft een eigen karakter en toch wordt het landschapspark één geheel. De werkzaamheden in Park Lingezen zijn in volle gang. In alle deelgebieden wordt de zogenaamde basisuitrusting aangelegd, een basis van paden, bermen, poelen en andere elementen die nodig zijn voor recreatie en natuur. Eind 2014 is deze basisuitrusting voor zo'n 80% gereed en kan Park Lingezen volop worden gebruikt door fietsers, wandelaars, ruiters, vissers en sporters die voor het grootste deel in de omliggende woonkernen wonen. En dat viert we volop in 2014! Onder andere met de Nationale Viering Boomfeestdag, de Dag van Park Lingezen, de Landschapstriënnale 2014 - een zomerfestival over landschap met allerlei tentoonstellingen, evenementen en lezingen - en in oktober met de Lingezenloop.

De eerste ideeën voor Park Lingezen ontstonden begin jaren negentig en kent dus inmiddels een omvangrijke geschiedenis. De komende maanden gaat het werk op volle toeren door en zullen er nog diverse besluiten genomen moeten worden.

In dit document gaan we in op de historie van Park Lingezen en de hoofdlijnen van de huidige stand van zaken voor de verschillende deelgebieden. Ook kunt u zich aanmelden voor o.a. de digitale nieuwsbrief (zie pagina 34), zodat u zich nog verder kunt verdiepen in Park Lingezen.

Vanzelfsprekend zijn de medewerkers van de parkorganisatie altijd van harte bereid om nadere informatie over Park Lingezen te geven.

Jan Willem Kamerman
Parkdirecteur

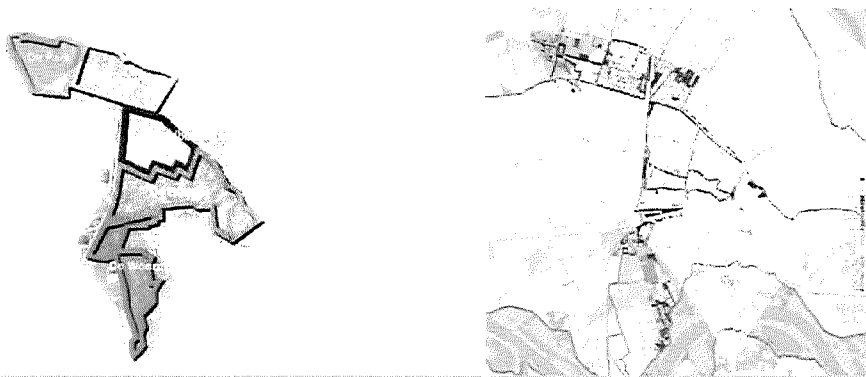

INLEIDING

Kort historisch overzicht

Park Lingezegen is een landschapspark in aanleg en is met 1700 ha het grootste landschapspark van Nederland. De eerste ideeën voor dit landschapspark dateren van begin jaren negentig, toen naar aanleiding van de nota Vinex de discussie over 'compact bouwen' en 'uitloopgebieden' op gang was gekomen. In die periode werd duidelijk dat het middengebied Arnhem-Nijmegen volledig dreigde te verstedelijken waardoor de kwaliteit van het woonklimaat én het vestigingsklimaat voor bedrijven, ernstig zou worden aangetast. Een belangrijke mijlpaal op weg naar de realisering van Park Lingezegen was de ondertekening van de bestuursovereenkomst in 2008. De belangrijkste afspraken die Provincie Gelderland, gemeenten Overbetuwe, Lingewaard en Arnhem, Waterschap Rivierenland, Stadsregio Arnhem Nijmegen en Staatsbosbeheer met de bestuursovereenkomst vastlegden waren:

- gezamenlijk Park Lingezegen aanleggen
- masterplan voor de inrichting van een basisuitrusting in 2013 en een streefbeeld in 2025
- begroting van de kosten (€ 68,5 miljoen) en een verdeling van de kosten
- oprichting van een zelfstandige organisatie (Wgr, Wet gemeenschappelijke regeling) voor het realiseren van Park Lingezegen en de coördinatie van het beheer
- afspraken, op hoofdlijnen, over het beheer door de eindbeheerders en een verdeling van de kosten voor het beheer

Sinds de ondertekening van de bestuursovereenkomst is door de projectgroep en later de projectorganisatie Park Lingezegen hard gewerkt aan de voorbereiding van de uitvoering. Het masterplan is via doorontwerpen en voorlopige ontwerpen vastgelegd in definitieve ontwerpen. Deze ontwerpen zijn per deelgebied uitgewerkt tot de basisuitrusting van in totaal ongeveer 450 ha. De toekomst van het gebied is vastgelegd in een intergemeentelijke structuurvisie. Ook zijn voor het hele gebied nieuwe bestemmingplannen opgesteld.



Vanaf het begin van de planfase zijn de toekomstige gebruikers van het gebied, bewoners en omwonenden van Park Lingezegen, betrokken bij het maken en uitwerken van de plannen. Hiervoor zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd waarin belangstellenden werden geïnformeerd en hun reactie konden geven.

Parkorganisatie

Op 1 december 2010 is de Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen (Wgr, dus het samenwerkingsverband) opgericht door de Provincie Gelderland, gemeenten Arnhem, Lingewaard en Overbetuwe en Waterschap Rivierenland. Deze parkorganisatie is opgericht voor onbepaalde tijd en heeft de opdracht om de basisuitrusting van Park Lingezegen aan te leggen én het beheer van Park Lingezegen te coördineren.

De parkorganisatie bestaat uit ongeveer 20 medewerkers, een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). De medewerkers werken, onder leiding van de parkdirecteur, voor de parkorganisatie via een detacheringsconstructie, een opdracht of inhuur. De meeste medewerkers komen uit de ambtelijke organisatie van verbonden partijen, DLG (Dienst Landelijk Gebied) en Staatsbosbeheer. Nadat de basisuitrusting is aangelegd zal de parkorganisatie krimpen tot een beheerorganisatie van enkele medewerkers.

Het AB bestaat uit een gedeputeerde van de provincie Gelderland (voorzitter), een wethouder van elke gemeente (Overbetuwe, Lingewaard en Arnhem) en een bestuurder van het Waterschap Rivierenland. Sinds 2014 maakt ook een wethouder van de gemeente Nijmegen deel uit van het bestuur, omdat Nijmegen in juli is toegetreten tot de Wgr. Staatsbosbeheer en de Stadsregio zijn als adviseur aan het AB en DB toegevoegd. Het AB stelt de jaarrekening en de begroting vast en vergadert ongeveer 3 keer per jaar. Het DB wordt gevormd door leden uit het AB en bestaat uit de gedeputeerde (voorzitter) en de wethouders van de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard. Het DB komt ongeveer 10 keer per jaar bijeen.



Klankbordgroep

In het begin van de planfase is een klankbordgroep ingesteld. De klankbordgroep geeft gevraagd en onge-
vraagd advies aan de parkorganisatie. In de klankbordgroep zijn ongeveer 40 organisaties vertegenwoordigd
zoals wijkplatform, natuurorganisaties, sport- en ruiterverenigingen. Wanneer de basisuitrusting is aangelegd
breekt er voor de klankbordgroep ook een nieuwe fase aan. De klankbordgroep transformeert zich hierom
de komende periode tot 'gebruikersraad'.

Meldpunt

Sinds september 2012 bestaat het meldpunt Park Lingezen. De parkorganisatie heeft dit meldpunt inge-
richt zodat er een duidelijke plek is waar, met name, de bewoners van het gebied met hun vragen, ideeën en
klachten terecht kunnen. Het meldpunt verzamelt de 'meldingen', handelt deze in overleg met projectleiders
af en koppelt dit terug naar de melder. Ook komen regelmatig meldingen binnen die voor een gemeente,
Staatsbosbeheer of het Waterschap bestemd zijn. Die meldingen worden doorgegeven en gemonitord.

Supervisor

De parkorganisatie heeft een supervisor aangesteld. Sinds het najaar van 2013 is dit landschapsarchitect
Sylvia Karres. De supervisor heeft als taak de ruimtelijke kwaliteit van Park Lingezen te borgen en geeft
de parkorganisatie en het DB gevraagd en ongevraagd advies. Zij neemt ook deel aan de DB-vergaderingen.

De rol van de supervisor is stimulerend, initiërend en toetsend. Naast de formele plannen baseert zij zich
daarbij op drie documenten, die op verschillende niveaus de gewenste ruimtelijke kwaliteit van Park Linge-
zen beschrijven. Het gaat om:

- Lofzang op de Betuwe; het ruimtelijk kwaliteitskader voor het landschap
- Het kwaliteitskader bebouwing, voor (welstandsplichtige) bouwwerken
- Het kwaliteitskader voor het parkmeubilair

Het is de taak van de supervisor om bij de realisatie van de basisuitrusting en bij nieuwe initiatieven toe te
zien op het toepassen en interpreteren van deze kwaliteitskaders. Daarin heeft de supervisor zowel een
toetsende als een stimulerende rol. Momenteel loopt er een opdracht aan het Gelders Genootschap om de
borging van de kwaliteit van Park Lingezen vast te leggen en op een goede manier af te stemmen met de
gemeentelijke welstandsadvieser.

Procedure nieuwe bestuursleden

De Gemeenschappelijke Regeling regelt onder andere de samenstelling van het bestuur. Het DB bestaat uit
twee wethouders van de grondgebiedgemeenten (Lingewaard en Overbetuwe) en een gedeputeerde van
Gelderland (voorzitter). Het AB wordt gevormd door de wethouders van de gemeenten, een bestuurder van
Waterschap Rivierenland en de gedeputeerde van Gelderland.

In de Regeling staat vermeld hoe een bestuurslid toetreedt tot het bestuur. Dit is vrij formeel geregeld.

In de Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezen ligt ook vast welke bestuursleden waartoe bevoegd
zijn. Er is daardoor eigenlijk geen keuze: de wethouders die naar voren worden geschoven door Lingewaard
en Overbetuwe worden lid van het DB. Tevens zijn zij lid van het AB, evenals de wethouders van Arnhem en
Nijmegen. De gemeenten geven zelf aan welke wethouders verantwoordelijk zijn voor de portefeuille Park
Lingezen.

Nadat bekend is welke wethouders toetreden tot het bestuur, wordt een AB-vergadering belegd, waarin
de overdracht van taken plaatsvindt. Formeel worden de wethouders aangewezen door het AB. De stukken
hiervoor worden door de parkorganisatie voorbereid.



De Park Projecten van de Rijn

Deelgebied De Park ligt tussen de nieuwbouwwijk Schuytgraaf (Arnhem) en Elst. Oostelijk grenst het aan deelgebied Het Waterrijk, westelijk ligt de Betuwe. Deelgebied De Park zal nog het meest op een stadspark lijken. Een mozaïek van lanen, stukken bos en open gedeelten, doorsneden door paden, biedt volop mogelijkheden tot recreëren voor vooral inwoners van Elst en Schuytgraaf. Het deelgebied is vernoemd naar voormalig kasteel De Park, waarvan de contouren en de oprijlaan nog te herkennen zijn. Dwars door De Park loopt het Romeinse Lint, een markante brede parkzone. In deze zone ligt een watergang met een voet- en fietsverbinding, gelegen op een oude loop van de Rijn in de Romeinse tijd.

Het Definitief Ontwerp (DO) voor De Park, van landschapsarchitect Abe Veenstra in 2009, is gebaseerd op de vorming van het gebied en het historisch gebruik ervan. De drie belangrijkste elementen in het ontwerp zijn het Kasteel, het Romeins Lint en het Mozaïek.

Kasteel

In deelgebied De Park ligt het historische kasteelterrein, waar vroeger kasteel De Parck stond. Het deelgebied is hiernaar vernoemd. Dit terrein wordt een centrale plek en een evenemententerrein. De monumentale kasteellanen worden opgeknapt tot mooie toegangswegen vanuit de omgeving.

Romeins Lint

Mede op basis van oude stroomgordels in de ondergrond, komt er in De Park een open ruimte (in de vorm van een 'schicht') met zowel een ecologische, recreatieve als landschappelijke betekenis. Deze ruimte wordt afgebakend door het Romeins Lint: een nieuw landschappelijk en recreatieve structuur die het gebied doorsnijdt en de verbinding vormt tussen Elst en Arnhem. Het Romeins Lint wordt een 'circuit', dat een aantrekkelijke route door De Park vormt voor met name actieve, sportieve vormen van recreatie zoals fietsen en skeeleren ('alles op rolletjes'). Het 'lint' legt een directe verbinding met vergelijkbare structuren in de aangrenzende wijk Schuytgraaf.



Mozaïek

Het landschap rondom het kasteel en het Romeins Lint wordt verder ontwikkeld tot een landschapsmozaïek met een afwisseling van bossen, houtwallen, boomgaarden en open plekken. Een fijnmazige dooradering met routes maakt het landschap toegankelijk voor de aanwonenden.



Het DO De Park vormt nog steeds uitgangspunt voor het ontwerp. Tot op heden zijn er de volgende aanpassingen en risico's in het ontwerp voorzien:

Ophoging kasteelterrein

Om van het kasteelterrein een geschikt evenemententerrein te maken, moet de eerste meter beneden maaiveld goed gedraineerd worden. Op het kasteelterrein ligt een archeologisch hoge verwachting, en het gebied is verdacht van conventionele explosieven. Daarom is het kosten- en uitvoeringstechnisch niet wenselijk om het bestaande maaiveld een meter te ontgraven om daarna een nieuwe laag zand inclusief drainage aan te leggen. Als alternatief kan het kasteelterrein een meter worden opgehoogd om hierin drainage aan te leggen. Onderzoeksbureau Fugro is gevraagd om de zettingen (het samendrukken van de ondergrond) in deze situatie te berekenen. Zodra de zettingen bekend zijn kan met de betrokken archeologen overeenstemming worden bereikt over de geplande ophoging. Inmiddels is met Abe Veenstra, landschapsarchitect, de ophoging besproken en akkoord bevonden. De verwachte zettingen worden binnenkort met de gemeente Overbetuwe besproken.

Fundering fiets-skeelerpad

Het geotechnisch onderzoek wees uit dat het 'circuit' (fiets-skeelerpad) op een aantal cruciale punten over een periode van 30 jaar teveel zal gaan zetten. Er is daarom besloten om gedurende een half jaar met 1,5 meter zand als voorbelasting de zetting te versnellen. De eerste zettingsberekeningen geven aan dat de voorbelasting zijn werk heeft gedaan. De restzetting over 30 jaar valt daardoor binnen de norm. Uitvoering van het WRM (Woon Rijp Maken) is september 2014 gereed.

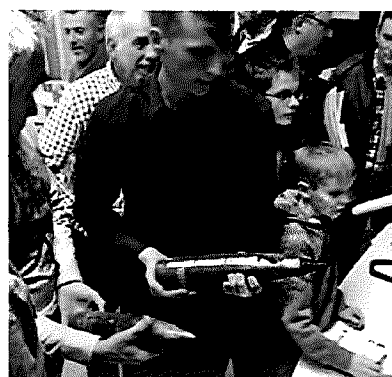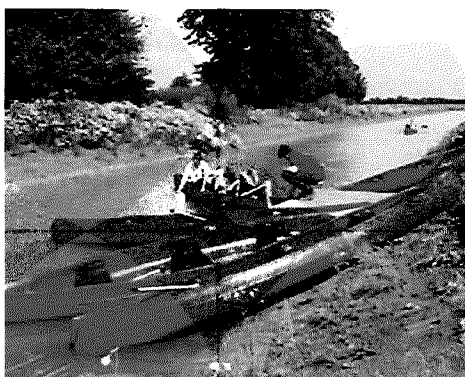

Aanpassingen van deelen van tracé

In het landschapsonderzoek waren enkele delen van tracé's (delen van waterlopen en fietspaden) gepland op locaties die niet logisch aansluiten op de huidige situatie. Zo was bijvoorbeeld een fietspad gesitueerd op de plek van een huidige watergang, en was een nieuw te graven watergang direct hiernaast gepland. In overleg met landschapsarchitect Abe Veenstra zijn hier een paar kleine aanpassingen gedaan, zodat de planning van nieuwe tracé's meer aansluiten op huidige functies en locaties.

Westelijke laan

In het ontwerp van De Park is een laan opgenomen van het kasteelterrein naar de Grote Molenstraat. Deze laan gaat over het terrein van golfbaan Welderen. Met de exploitant van golfbaan Welderen wordt onderzocht of het aanleggen van de westelijke laan mogelijk is in combinatie met een reconstructie van de golfbaan.

Materialisering toegangsweg De Park

Langs de toegangsweg De Park liggen nu zware kabels, van en naar het verdeelstation, gelegen aan de noordzijde van het kasteelterrein. De toegangsweg wordt in de nieuwe situatie, conform het landschapsonderzoek, een stukje opgeschoven, waarbij watergangen en laanbomen beoogd zijn. Normaliter worden kabels en leidingen (K&L) in de berm gelegd, buiten de kroonprojectie van de bomen i.v.m. de beworteling. Maar gezien de hoeveelheid en soort K&L is verleggen een zeer kostbare aangelegenheid. Om hoge verleggingskosten te voorkomen, zullen de K&L zoveel mogelijk op de huidige plek blijven liggen. Ze komen daardoor in de nieuwe situatie onder de rijbaan te liggen. In het oorspronkelijke ontwerp was de toegangsweg voorzien van asfalt. Vanwege de voorgestelde ligging van K&L onder de rijbaan is in het ontwerp een verharding van gebakken klinkers opgenomen. Dit is ook afgestemd met en akkoord bevonden door Abe Veenstra en de gemeente Overbetuwe.

Zuidelijk oas.

Het volledige landschapsonderzoek van Abe Veenstra betrof ook een deel ten zuiden van de Linge. Echter, doordat deze gronden nog niet in eigendom zijn van het projectbureau, valt dit deel tot op heden buiten alle voorbereidingen en realisatie van de basisuitrusting.

Ook de twee bruggen over de Linge vallen op dit moment buiten de opdracht, aangezien hiervoor landhoofden op gronden ten zuiden van de Linge zijn voorzien. Hetzelfde geldt voor de westelijke toegangsweg. Deze is gesitueerd op particulier eigendom. Op het moment dat alle bovengenoemde gronden in eigendom zijn van en toegankelijk voor het projectbureau, wordt gestart met de voorbereidingen en realisatie van deze delen van de basisuitrusting.

Toegangsroute De Park vanuit Elst-Noord

Op dit moment is niet voorzien in een aansluiting vanuit Elst-Noord op De Park. Hierover is contact gelegd met gemeente Overbetuwe. Er is nu een principe-toegang aangewezen op een plek die de meest logische aansluiting oplevert (kortste route) en de minst juridische uitdagingen. Momenteel worden de mogelijkheden voor een definitieve fietsaansluiting onderzocht.

Spoorwegovergang

In opdracht van het DB wordt gekeken of het risicoprofiel en het kostenaspect van de spoorkruising verlaagd kan worden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de parkorganisatie in nauwe samenwerking met ProRail, landschapsarchitect Abe Veenstra, gemeente Overbetuwe, Van Tongeren en Bartels Ingenieursbureau. Het rapport met aanbeveling zal medio 2014 gereed zijn.



HET WATERRIJK

Projectleider Joop Eilander

Deelgebied Het Waterrijk is gelegen tussen de Linge, Bergerden, Arnhem-Zuid en de oude Rijksweg, en wordt in zijn geheel verworven en ingericht. Het gebied is ruim 200 ha groot en wordt bij benadering voor 1/3 ingericht als bos, 1/3 als bloemrijk grasland en 1/3 als moeras. Het gebied wordt door de A325 in twee ongeveer gelijke delen gesplitst: Het Waterrijk-west en Het Waterrijk-oost.

Het overgrote deel van het gebied is inmiddels verworven en vrijgegeven voor de realisatie. Met vier eigenaren is overeenstemming bereikt, maar moet de overdracht nog plaatsvinden. Met slechts één eigenaar is nog geen overeenstemming bereikt.

In principe is de realisatie van het gehele deelgebied Het Waterrijk in één contract aanbesteed. Uitzonderingen hierop zijn de aanplant van de bosgebieden, de productie van het parkmeubilair (parkbreed aanbesteed) en de aanleg van een voetgangersbrug over de Linge (wanderverbinding naar Westeraam). De eerste voorbereidingen voor de aanbesteding van de voetgangersbrug zijn inmiddels gestart. De bossen zijn voor een groot deel ingeplant. In oktober 2013 is het contract met aannemer Van de Wetering gesloten.

Het grootste deel van het werk betreft het ontgraven van het moeras en de afvoer van de uitkomende klei (ca. 800.000 m³). Er is gekozen voor een inkoopstrategie middels een zogenaamd 'geïntegreerd gebiedscontract'. Dit houdt in dat het ontwerp tot in behoorlijk detail is vastgelegd, maar dat de aannemer voor een groot deel vrij is zelf te bepalen hoe hij het werk doet. Dat betekent dat de aannemer ook in hoge mate zelf verantwoordelijk is voor het eindresultaat. Hij dient ook zelf vergunningen aan te vragen, overleg te voeren met bevoegde gezagen, et cetera. Voordeel van deze contractvorm is dat de meeste risico's bij de aannemer liggen. Alleen risico's die de aannemer zelf niet kan beheersen liggen nog bij de opdrachtgever, zoals het voorkomen van onverwachte milieuspots.

In de loop van de uitvoering kunnen wel contractwijzigingen worden overeengekomen, zowel op verzoek

van de opdrachtgever als op verzoek van de aannemer. In het contract zijn een paar mijlpalen opgenomen:

- 31-12-2014 moet de waterberging gereed zijn (tussen Kampsestraat en A325)
- 31-12-2016 moet Het Waterrijk-oost gereed zijn
- 31-12-2018 moet Het Waterrijk-west gereed zijn

Na de genoemde opleverdata heeft de aannemer nog een onderhoudsplicht van drie jaar voor met name het moerasgebied (rietontwikkeling). De start van de uitvoering vond plaats in het voorjaar van 2014.

Wanderverbindingen


Met de gemeenten Overbetuwe en Arnhem zijn in het verleden principe-afspraken gemaakt over het aanleggen van een wanderverbinding naar de wijken Westeraam en Rijkerswoerd. Beide gemeenten hebben die verbinding ambtelijk in voorbereiding, maar definitieve besluitvorming moet nog plaatsvinden. Hangende de besluitvorming in Overbetuwe is reeds begonnen met de voorbereiding van de geplande voetgangersbrug over de Linge.

Verkeersbesluiten

Uitgangspunt in het ontwerp voor Het Waterrijk was dat de Kerkstraat en de Kampsestraat worden afgesloten voor autoverkeer, of in ieder geval het autoverkeer sterk zou worden beperkt. De gemeente moet daarvoor nog een verkeersbesluit in voorbereiding nemen. Hierover lopen ambtelijk goede contacten met de gemeente.

Muggen en knutten

Tijdens de planvoorbereiding is er veel aandacht geweest voor mogelijke overlast van muggen en knutten

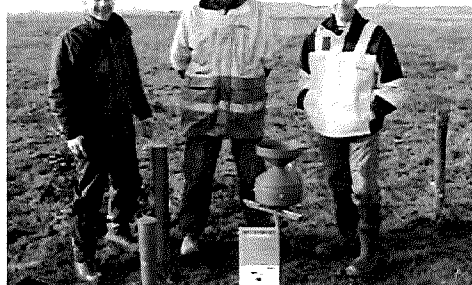

na de aanleg van het moeras. In het definitief ontwerp is op advies van deskundigen een aantal maatregelen genomen om overlast te voorkomen. In de afgelopen twee zomerseizoenen zijn metingen verricht naar het huidige voorkomen van muggen en knutten (nulmeting). Momenteel lijkt de angst voor muggen en knutten behoorlijk te zijn afgenomen. Desalniettemin is het aanbevelenswaardig om ook in de toekomst de ontwikkeling van muggen en knutten te blijven volgen. Komend jaar is dat nog niet aan de orde.

Starthandeling

Op de Dag van Park Lingezen (29 juni) vond een formeel startsein plaats voor de realisatie van Het Waterrijk. Er zijn toen ook publieksactiviteiten in Het Waterrijk-oost georganiseerd.



HET LANDBOUWLAND

Projectleider Coen van Dijk

In Het Landbouwwand houden boeren blijvend een plek. Het gebied is door zijn weidsheid aantrekkelijk om in te fietsen, skeeleren of om een flinke wandeltocht te maken, en daarvoor zullen er dus zeker meer mogelijkheden komen.

Idylle Elsterbrug

In Het Landbouwwand wordt gewerkt aan de Idylle 'Elsterbrug'. Er wordt een eilandstructuur aangelegd. Het middeneiland wordt ingericht naar een ontwerp van Herman Verkerk. Een belangrijk element daarin is een muur waarin urnen kunnen worden geplaatst. De omliggende eilandjes worden ecologisch ingericht. Het grondwerk is gegund en de uitvoering is eind 2014 gereed.

Aandachtspunt is het realiseren van de muur en een toegangspoort. Deze lijken niet te passen in het vigerende bestemmingsplan. In overleg met gemeente Overbetuwe wordt bekeken wat hier mee moet gebeuren. Voor de voortgang van het project is het belangrijk hier snel een overeenstemming te krijgen.

Pocketpark Bredelaar

Pocketpark Bredelaar is een klein parkje aan de Breedlersestraat. Het toekomstige pocketpark bevindt zich op een archeologisch monument. Hiermee is rekening gehouden bij het maken van het ontwerp. Het terrein wordt opgehoogd om te voorkomen dat er (diep) in de grond gewerkt moet worden. Het werk is eind 2014 gereed. De gemeente is beoogd eigenaar en beheerder van het park. In het ontwerp is o.a. voorzien in plantbedden voor het telen van vergeten groenten. In overleg met de gemeente Overbetuwe wordt gezocht naar een geschikte partij die deze groenten wil verbouwen. Mocht het niet lukken om een partij te vinden dan worden de plantbedden ingezaaid met een bloemenmengsel en neemt de gemeente het beheer op zich. De omgeving is nadrukkelijk betrokken en heeft ook invloed gehad op ontwerp en inrichting.



DE LINTEN

Projectleiders: Coen van Dijk en Janet Holland

Een kleinschalig stukje Betuwe, dat is het karakter van De Buitens. Gelegen op de veilig hoge oeverwal, is dit al een van oudsher dichterbewoond gebied. Dit is dan ook het enige gebied waar nog nieuwe bebouwing mogelijk is, in de vorm van nieuwe landgoederen of nieuwe erven. Uiteraard onder de voorwaarde dat het bijdraagt aan een mooi en typerend landschap, dat het bijdraagt aan het park.

Pocketpark De Poel

Aan de Kattenleger wordt een klein parkje gerealiseerd: pocketpark De Poel. Beoogd eigenaar en beheerder is Staatsbosbeheer. Het bestek is gereed en het werk is aanbesteed. Het werk wordt begin 2015 afgerond. De inrichting bestaat uit het vergroten van de bestaande vijver, het opnieuw aanleggen van beplanting en het aanleggen van een parkeerplaatsje en speelvoorzieningen. Voor ontwerp en aanleg van dat laatste worden leerlingen van lokale scholen betrokken.

De Linten

Het ontwerp van De Linten beslaat de deelgebieden Het Landbouwwand en De Buitens, gelegen in de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard. In augustus 2013 vond de aanbesteding plaats van De Linten. Het gebied ten oosten van de Karstraat valt buiten de scope van deze aanbesteding. Het werk is aanbesteed aan Bruil Infra B.V. Op dit moment is het werk volop in uitvoering. De planning is dat eind 2014 het werk is afgerond, inclusief alle beplanting.

Verkeersbesluit a.w.v. uw maken Breedlersestraat

Uitgangspunt in het ontwerp is dat de Breedlersestraat wordt afgesloten voor autoverkeer, of in ieder geval dat het autoverkeer sterk zal worden beperkt. Bestuurlijk is gekozen voor het autoluw maken middels bebording. Hier moeten de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard nog een verkeersbesluit over nemen. De ambtelijke voorbereidingen hiervoor zijn in goede samenwerking in volle gang. Ook is de politie vanuit

handhavingsaspecten nauw betrokken. Het is van groot belang dat de Breedlersestraat pas autoluw wordt gemaakt nadat het vrijliggende fietspad aan de Kattenleger is gerealiseerd.

Grondaankopen vrijliggende fietspad Kattenleger

Voor de realisatie van het vrijliggende fietspad Kattenleger is een aantal gronden nog niet in eigendom. De onteigeningsprocedure hiervoor loopt. Op dit moment vinden er nog steeds gesprekken plaats om minnelijk tot overeenstemming te komen. Het gaat hierbij om de volgende percelen: Broekman, Van der Plaat en Zaat. In een bestuurlijk overleg met de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard is afgesproken dit traject te blijven volgen en het fietspad te realiseren daar waar de gronden in eigendom zijn.

Ecologische stapsteen Breedlersestraat

Aan het eind van de Breedlersestraat tegen de A325 wordt een bos aangelegd. De aanleg hiervan is meegenomen in het bestek van De Linten. De aanleg is gestart tijdens de Nationale Boomfeestdag. Het restant van het perceel zal eerst nog opgehoogd worden, daarna wordt dit deel ook ingepland. Het ophogen is nodig vanwege de hoge archeologische waarden van het perceel. De werkzaamheden zullen eind 2014 worden afgerond. Het bos is door Stichting DE 4DAAGSE geadopteerd als het 'Vierdaagsebos'.

Inrichting rondom de A15

Aan de noord- en zuidzijde van de A15 zijn natuur- en recreatiegebieden gepland. Bij het noordelijke deel ligt de nadruk op natuur, bij het zuidelijke op recreatie. Er wordt al geruime tijd met RWS (Rijkswaterstaat)/ViA15, Lingewaard, Overbetuwe en de provincie overlegd over de inrichting van deze percelen, al dan niet in combinatie met de aanleg van de A15. Dit heeft tot nu toe niet geleid tot besluitvorming. In de begroting van Park Lingezen is uitgegaan van een synergievoordeel door het maken van werk met werk. De



parkorganisatie heeft graag zo snel mogelijk duidelijk welke mogelijke samenwerking er is met het project 'doortrekking A15' en of dit inderdaad een synergievoordeel oplevert. Als er geen samenwerking mogelijk is, is belangrijk dat de inrichting van de percelen zo snel mogelijk wordt opgepakt. Inrichting in 2014 lijkt op dit moment niet meer mogelijk.



DE WOERDT

Projectleider: Tien van Dijk

Deelgebied De Woerdt sluit aan op de landschapszone in de Waalsprong. Het gebied markeert de overgang van stad naar platteland. Door de vele boomgaarden en bijvoorbeeld het beschermd dorpsgezicht van Ressen of de lanen van Landgoed Doornik, is wandelen en fietsen aantrekkelijk in dit gebied.

Bemmelse Zeeg

Deelproject Bemmelse Zeeg betreft de aanleg van enkele bospercelen en natuurvriendelijke oevers langs de Bemmelse Zeeg. Het bestek is voorbereid, de aanleg en realisatie vinden plaats in najaar/winter 2014. Het concept-bestek is besproken met omwonenden en opmerkingen daarop zijn verwerkt.

Aandachtspunt

Het huidige ontwerp past niet in het vigerende bestemmingsplan. Daarom is er een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Dat is nu in procedure. Wanneer dit niet tijdig wordt vastgesteld kan de bovengenoemde uitvoeringsplanning in gevaar komen.

Klompenpad

Met agrariërs en particulieren is overeenstemming bereikt over de realisatie van een Klompenpad. Dit pad is in 2014 gerealiseerd. De feestelijke opening vond plaats tijdens de Dag van Park Lingezege op 29 juni 2014. Het Klompenpad ligt in de omgeving van Ressen, Bemmelse Zeeg en Doornik.

Aandachtspunt

Een deel van het oorspronkelijke tracé van het Klompenpad kon niet gerealiseerd worden omdat RWS een eerdere toezegging tot gebruik van een aantal kavels langs de A325 heeft ingetrokken. Er loopt nog overleg met RWS over een vergoeding van de daardoor door de parkorganisatie - ten onrechte - gemaakte kosten.



BEHEER

Projectleider Anton de Kleijn

Idylle Ressen

In Ressen is ook een idylle gepland. De daarvoor benodigde grond is nog niet verworven. Ook staat de huidige eigenaar betreding van het perceel niet toe. De planvorming voor dit deel ligt daarom stil omdat onderzoek ter plekke (met name archeologie) nodig is om verdere stappen in te kunnen zetten.

Kersenwei

De inrichting hier blijft beperkt tot een verzoek aan de huidige grondeigenaar of er wellicht een (gras) pad over zijn kavel kan worden aangelegd. Daarnaast zal er wat parkmeubilair in de omgeving worden geplaatst en worden bij een eerstvolgende onderhoudsronde de bomen vervangen door de gemeente.

Landgoed Doornik

De inrichting van dit landgoed is nagenoeg afgerond in april 2014. Er worden in de omgeving nog twee kassen gesloopt. Dit zal in de loop van 2014 plaatsvinden. Daarna zal een deel van het vrijkomende terrein ingericht worden als kersenwei en bos. Dit zal naar verwachting najaar 2014 plaatsvinden in combinatie met de inrichting van het Spiegelbos (zie hieronder).

Spiegelbos

Het Spiegelbos is eigendom van de gemeente Nijmegen, maar ligt in de gemeente Lingewaard. Er is overleg met de gemeente Nijmegen over een kleine aanpassing van het bestaande bos conform het ontwerp van Park Lingezen. Naar verwachting worden deze aanpassingen eind 2014 uitgevoerd. Op haar eigen grondgebied (rondom de kolk nabij Zijdewinde) is de gemeente Nijmegen gestart met het aanpassen van het bestemmingsplan. In het nieuwe bestemmingsplan wordt het mogelijk een aantal woningen te bouwen, zoals ook vastgesteld in een visie van het DB van Park Lingezen. Deze ontwikkeling wordt samen opgepakt met de ontwikkeling van het Vitenspompegebouw. De contacten en afstemming hierover tussen Nijmegen en de parkorganisatie zijn goed.

Nadat de basisuitrusting is aangelegd, start het beheer. Al in de bestuursovereenkomst (2008) is vastgelegd dat de parkorganisatie de coördinatie van het beheer op zich zal nemen. Om deze reden is de parkorganisatie (Wgr) opgericht voor onbepaalde tijd. In de bestuursovereenkomst en in de aanvullende overeenkomst bij de regeling (Wgr) bij oprichting is op hoofdlijnen vastgelegd door welke partijen het beheer uitgevoerd zal worden. Ook zijn afspraken gemaakt over de financiering van de kosten van het beheer:

- het beheer van de 'nieuw gecreëerde' openbare ruimte zoals fietspaden en bermen zal worden uitgevoerd door de gemeenten
- de watergangen zullen worden beheerd door Waterschap Rivierenland (in natura inbreng Waterschap)
- het 'vlakgroen' zal worden beheerd door Staatsbosbeheer

De uitgangspunten voor het beheer zijn opgenomen in de beheervisie Park Lingezen. De beheervisie is inhoudelijk besproken en akkoord bevonden in het DB, maar nog niet formeel vastgesteld. De beheervisie zal worden vastgesteld wanneer de beheerplannen van de beheerders gereed zijn, rond de zomer van 2014.



PRIVATE INITIATIEVEN

Projectleider Edwin van der Staaij

De DO's voor Park Lingezegen zijn momenteel volop in uitvoering en dat betekent dat de basisinrichting van het landschapspark wordt aangelegd en beschikbaar komt voor de bewoners van het gebied. Via diverse presentaties, publicaties en bijzondere evenementen als de Dag van Park Lingezegen, worden de omwonenden geïnformeerd over de vaak onverwachte kwaliteiten van het landschapspark en uitgenodigd om het gebied te bezoeken en de mogelijkheden te benutten.

Door de toename van recreanten ontstaan namelijk kansen voor bewoners van het gebied om bijvoorbeeld een terras te openen of hun bedrijf open te stellen en producten te verkopen. Daardoor wordt de levendigheid van het landschapspark vergroot en dat werkt positief op de aantrekkingskracht van Park Lingezegen. Het landschapspark wordt dan meer van de bewoners.

Voorwaarde is natuurlijk dat nieuwe initiatieven niet ten koste gaan van de sfeer die Park Lingezegen wil uitstralen. Daarom is een procedure opgesteld. Bij een nieuw idee vindt eerst een intake plaats door de parkorganisatie. Is het idee voldoende concreet, dan wordt het besproken in een werkgroep met de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard. De werkgroep brengt vervolgens advies uit aan het parkbestuur, dat daarop besluit om al dan niet medewerking te verlenen. Medewerking kan betekenen dat de initiatiefnemer wordt aangeraden om het idee in een bepaalde richting uit te werken. Ook kan het gemeentebestuur worden verzocht het bestemmingsplan aan te passen of benodigde vergunningen te verlenen.

Er komen regelmatig private initiatieven binnen, variërend van de bouw van een schuur, de aanleg van een vliegveld en een circuit voor modelauto's tot het ontwikkelen van een historisch park. De parkorganisatie heeft het initiatief genomen om te komen tot een uniform toetsingskader voor het hele grondgebied van Park Lingezegen, met een uniforme procedure.

BESTEMMINGSPLANNEN

Jaap Roest, jurist

Drie bestemmingsplannen zijn voor Park Lingezegen onherroepelijk en beslaan het totale grondgebied van het landschapspark. Bij de Bemmelse Zeeg in Lingewaard is één aanpassing in de ontwerpen doorgevoerd, waardoor dat ontwerp in strijd is met het bestemmingsplan. Daarom is er een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor dat gebied. Het ontwerpbestemmingsplan heeft inmiddels ter inzage gelegen en zal binnenkort worden aangeboden aan de gemeenteraad van Lingewaard. In Overbetuwe zijn meerdere aanpassingen noodzakelijk. Bestemmingsplannen voor die aanpassingen zijn inmiddels opgesteld en het eerste ontwerpbestemmingsplan ligt van 21 augustus tot 2 oktober 2014 ter inzage.



COMMUNICATIE

Projectleider Kristel Kleinhesselink

Tijdens de verbouwing is de winkel open. Dat is het uitgangspunt van het communicatieplan.

We communiceren enerzijds over de plannen voor het gebied, de werkzaamheden die er plaatsvinden en de mogelijke overlast die men kan ervaren (en die we uiteraard zoveel mogelijk proberen te voorkomen). Anderzijds communiceren we ook over feestelijke openingen, evenementen en recreatiemogelijkheden om mensen te enthousiasmeren voor het landschapspark en te laten zien dat het een mooi gebied wordt en dat er volop mogelijkheden zijn. Uit een recent onderzoek is gebleken dat ongeveer 75% van de omwonenden bekend is met Park Lingezen.

De communicatie richt zich vooral op bewoners, grondeigenaren, huidige en toekomstige gebruikers. Naarmate de werkzaamheden zijn afgerond, komt de nadruk vooral te liggen op het verder onder de aandacht te brengen van Park Lingezen bij de huidige en toekomstige gebruikers. In de loop van 2014 zal daarom worden uitgewerkt hoe de 'marketing' voor Park Lingezen kan worden versterkt.

Communicatiemiddelen

In de communicatie zetten we de volgende communicatiemiddelen in: de website, Facebook, Twitter, de digitale nieuwsbrief, de tweemaandelijks paginagrote informatiepagina in de lokale huis-aan-huiskranten, de brochure, de recreatiekaart, diverse folders en infoopbijeenkomsten. Momenteel wordt een app ontwikkeld met alle recreatiemogelijkheden in Park Lingezen.

Deze communicatiemiddelen worden zo veel mogelijk cross mediaal ingezet, zodat de boodschap op zo veel mogelijk manieren bij de doelgroepen aankomt. Vaak zetten we de boodschap ook uit via de communicatiekanalen van de partners.



Beeld- en filmmateriaal

Beeld- en filmmateriaal verzamelen we met fotografen en De MediaManagers, die alles wat er in Park Lingezen gebeurt vastleggen en uitzenden (Kijkkanaal13). Park Lingezen heeft ook een eigen YouTube-kanaal, waar alle filmpjes te vinden zijn.

Werkwijze en organisatie

Sinds december 2013 wordt de communicatie uitgevoerd door een projectleider en een projectmedewerker communicatie, beiden ingehuurd voor 16 uur per week. De communicatieadviseurs van de deelnemende partijen overleggen sinds januari 2014 elke twee maanden met de projectleider communicatie over inhoudelijke of actuele onderwerpen (zoals de Landschapstriënnale, positionering Park Lingezen). Dit gebeurt aan de hand van de communicatiekalender. Daarnaast is er regelmatig onderlinge afstemming over communicatie (denk aan evenementen, afstemmen woordvoering, werkzaamheden).

Ook de projectleiders van de deelgebieden overleggen maandelijks met de projectleider communicatie over werkzaamheden en opleveringen. Waar nodig is er afstemming met de Klankbordgroep.

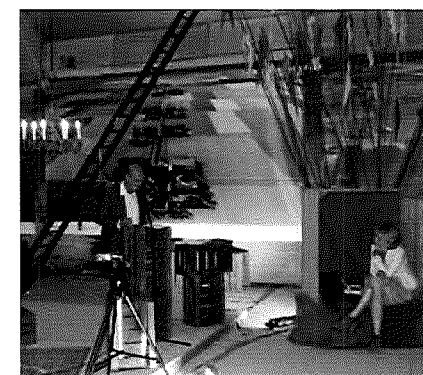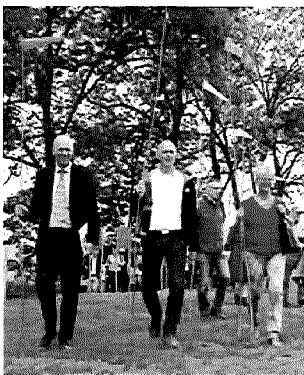

LANDSCHAPSTRIËNNALE

Projectleider Ingeborg Snelleman

De Landschapstriënnale is een driejaarlijkse manifestatie voor een breed publiek gericht op tuin-, park- en landschapsarchitectuur, waarbij de combinatie van landschap, kunst en cultuur centraal staat. Van mei tot en met september 2014 vond de Landschapstriënnale plaats in Park Lingezege. Tijdens de Landschapstriënnale 2014 werd gevierd dat bewoners, bedrijven en bezoekers van de regio Arnhem-Nijmegen het nieuwe landschapspark en de nieuwe natuur kunnen gaan betreden en koloniseren. Bovenal bood deze Landschapstriënnale een podium voor het bestuderen van ons landschap: Hoe heeft het zich ontwikkeld? Hoe kunnen we bouwen aan een mooie en veilige toekomst ervan? Met partijen uit heel Nederland is gewerkt aan een nieuwe visie op het landschap.

Parklandschap Lingezege: nieuwe stap in de parkontwikkeling

Het gebied Arnhem-Nijmegen herbergt twee eeuwen parkaanleg: het klassieke landschapspark Sonsbeek in Arnhem, het volkspark De Goffert voor de arbeiders in Nijmegen, functionalistische parken als Presikhaaf, het natuurontwikkelingspark Meinerswijk en het interactief ontworpen agrarisch cultuurlandschap in de Ooijpolder. Ontwerputgangspunt was het park als groene long in de drukke verstedelijkte samenleving. Lingezege is de volgende stap in deze reeks parken.

Voorbeeld voor Nederland én de wereld

Park Lingezege is het voorbeeld van de uitdaging waar Nederland voor staat: een rivierendelta, die steeds meer verstedelijkt en waar de 21ste-eeuwse verhouding tussen mens en landschap vorm krijgt. Park Lingezege laat zien hoe in een verstedelijkt landschap met parken kan worden omgegaan en wie daar verantwoordelijkheid voor heeft. Het is daarmee een voorbeeld voor de rest van Nederland en voor metropolen in de rest van de wereld.

Het programma

Het programma van de Landschapstriënnale bestond uit verschillende onderdelen:

Het onderdeel **Theater** voor het brede publiek presenteerde de wording van Park Lingezege. Muziek- en theatervoorstellingen werden gekoppeld aan de oplevering van verschillende projecten in Lingezege. Theatergezelschap de Plaats speelde De Kersentuin in en om het erf van boerderij De Bredelaar in Elst. MudBoot Sessions verzorgden akoestische muziekvoorstellingen op verschillende locaties en tijdens de voorstelling Halte Lingezege kregen bezoekers, rijdend in bussen door Lingezege, een andere blik op het landschap.

In het **Atelier** werden plekken en routes in en naar Park Lingezege verder ontwikkeld met inwoners en omwonenden van het Lingezege, met als doel het eigenaarschap van het gebied te vergroten. Staatsbosbeheer verzorgde in het Speelbos Schuytgraaf bij Arnhem en bij het Openluchtklaslokaal in Doornik activiteiten voor kinderen en volwassenen.

De **Etalage** bood ondernemers de gelegenheid om zich te presenteren, en toonde de bedrijvigheid in Lingezege. Op speciale dagen presenteren lokale ondernemers zich aan het publiek. Denk onder andere aan een midzomerdiner in de openlucht.

In de **Academie** vonden debatten, lezingen, cursussen, excursies en tentoonstellingen plaats over actuele opgaven en uitdagingen voor de inrichting van onze drukbevolkte delta. De academie mondde uit in een bouwdoos voor de inrichting en het beheer van het landschap in de 21ste eeuw. Tijdens het slotsymposium is het stokje overgedragen aan PARK21. In dit landschap in ontwikkeling tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp vindt de landschapstriënnale 2017 plaats.



NATIONALE VIERING BOOMFEESTDAG 2014


Projectleider Laura Ramaker

Op 12 maart vond de Nationale Viering Boomfeestdag plaats in Park Lingezege. Er deden ruim 650 kinderen mee van basisscholen uit de gemeenten Arnhem, Nijmegen en Overbetuwe. Weervrouw Helga van Leur en rapper Luc Weegels (DoubleL) presenteerden de Boomfeestdag 2014. Luc en Anne, Gerard Joling en Boyband B-Brave sloten de dag af met een optreden.

Het planten van de bomen vond plaats in een weide tussen de Breedlersestraat en de A325, ter hoogte van de viaduct bij Elst. Hier groeit nu het Vierdaagsebos, geadopteerd door de Stichting De 4DAAGSE ter ere van het 100ste jubileum in 2016. Ieder jaar lopen de Vierdaagselopers langs dit bos.

Voor het bos ligt een eikenweide, waar elke school een eigen schoolboom heeft geplant, inclusief een Boomfeestpaal met een plaquette met de naam van de school. Dit jaar kregen de Boomfeestpalen een fleurig tintje. De kinderen beschilderden de paal namelijk met allerlei fantasiedieren naar een idee van kunstenaar Suus Baltussen. Speciaal voor de Boomfeestdag werd er een cirkel aangeplant. Deze 12 bomen werden aangeplant door de o.a. Josan Meijers, presentatoren, politici, etc.

Ook was er een educatieve GroenMarkt in Intratuin Elst en een Jeugd-Groen-Debat. Hier leerden en debatteerden de kinderen over bomen en natuur met politici. Het was een geslaagde dag!



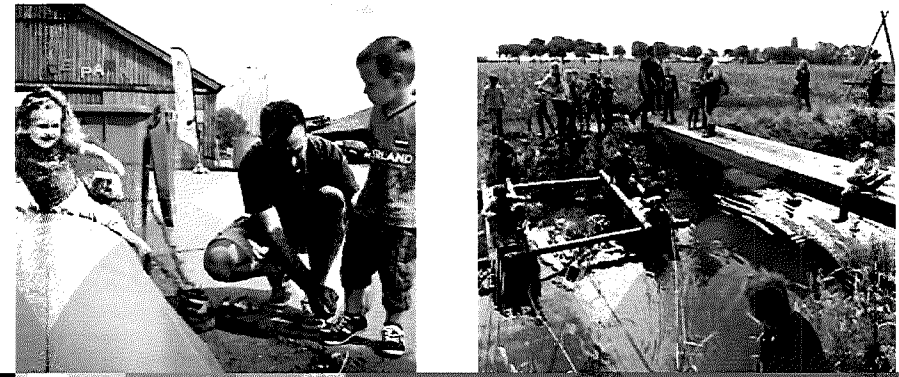


DAG VAN PARK LINGEZEGEN

Projectleider Laura Ramaker

Van 2006 tot en met 2012 (behalve in 2007) deed Park Lingezege mee met de nationale Dag van het Park (initiatief van de ANWB). De bezoekersaantallen vielen tegen, met name door slecht weer en door de concurrentie met andere parken en evenementen. Park Lingezege is een nieuw landschapspark en toen was er nog niet veel te zien. In 2013 is besloten om een Dag van Park Lingezege te organiseren in het laatste weekend van juni. Dan is de kans op goed weer groter en zijn er geen grote parken om mee te concurreren. In 2013 is dit voor het eerst georganiseerd en het was een succes.

In 2014 werd het georganiseerd op 29 juni. Tijdens de Dag van Park Lingezege vierden we de start van de werkzaamheden in Het Waterrijk, de opening van het Speelbos bij Schuytgraaf, de opening van een Exodus-fietsroute en de opening van het Klompenpad in De Woerdt. Op de drie feestpunten in De Park, De Woerdt en Het Waterrijk boden lokale ondernemers en Park Lingezege activiteiten aan. Mensen konden picknicken, wandelen en fietsen, met en zonder begeleiding en ook voor kinderen waren er diverse activiteiten. In de promotie van de Dag van Park Lingezege werkten we samen met het Streekgala dat op dezelfde dag plaatsvond in en rond De Woerdt. Ook deze Dag van Park Lingezege was een succes.

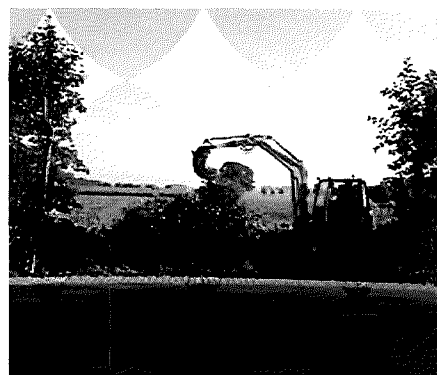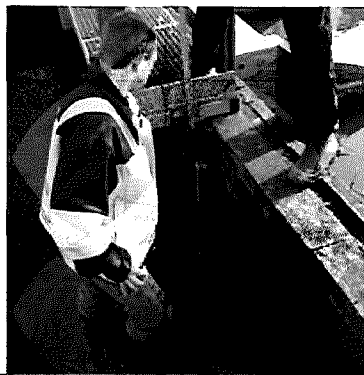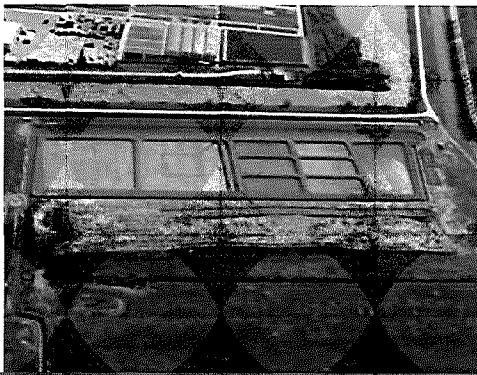

RICH WATER WORLD (RWW)

Projectleider Joop Eilander

Het onderzoeksproject Rich Water World omvat wetenschappelijk onderzoek, hoofdzakelijk in Het Waterrijk. Er is een proeflocatie aangelegd, waar onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden om met waterplanten het water te zuiveren vóór het wordt ingelaten in het moeras. Hierbij worden ook metingen gedaan naar abiotische factoren (grondwaterpeil, neerslag en verdamping, wegzijging/kwel, e.d.). De proeflocatie ligt in de meest zuidoostelijke hoek van Het Waterrijk-oost, nabij de inlaatstuw vanuit de Linge.

RIJNWAALPAD

De Stadsregio heeft de strijd aangeboden tegen de files in haar gebied en heeft daarvoor o.a. besloten om enkele snelfietsroutes aan te leggen. Dit zijn fietspaden, bedoeld om de forenzen in de regio te verleiden om gebruik te maken van de fiets en de auto te laten staan. Daarvoor is gekozen voor de kortste tracés en worden knelpunten als lastige kruisingen en verkeerslichten zoveel mogelijk vermeden dan wel opgelost. In de stadsregio zijn de volgende routes in ontwikkeling: Cuijk-Mook, de Liemers, Nijmegen-Beuningen en Rijn-Waal. Het RijnWaalpad wordt ontwikkeld door de Stadsregio, samen met de gemeenten Overbetuwe, Lingewaard, Arnhem en Nijmegen, de provincie en de parkorganisatie. Als belangenbehartiger neemt ook de Fietzersbond daaraan deel.

Het RijnWaalpad is momenteel voor het grootste gedeelte gerealiseerd. Aan enkele knelpunten wordt nog gewerkt, waarvan het belangrijkste momenteel de grondverwerving van het gedeelte tussen Kattenleger en Breedlersestraat is. Hiervoor loopt een onteigeningsprocedure die in de loop van 2014 zal worden afgerond. Naar verwachting zal het hele fietspad nog in 2014 kunnen worden opgeleverd, inclusief aansprekende verlichting. De afstand Rijnbrug-Waalbrug kan dan in 40 minuten worden afgelegd. Voor de bewegwijzering, waarvoor een eigen en herkenbaar ontwerp is gemaakt, start een pilot in het voorjaar. De app om potentiële fietsers te interesseren wordt momenteel geperfectioneerd en maakt deel uit van de intensieve PR-campagne rond de promotie van het project.

Het project betreft naast het aanleggen van het asfalt, ook de inrichting van de bermen. Volgens het ontwerp worden die alleen ingezaaid met gras. Verdere inrichting zoals de goede landschappelijke aansluiting op de DO's van het landschapspark, zijn dus voor de parkorganisatie. De ontwerpen daarvoor worden momenteel uitgewerkt en op basis daarvan worden nadere inrichtingsvoorstellen voorgelegd aan het bestuur.



BLIJF OP DE HOOGTE

Nieuwsbrief Lingezege

Wilt u maandelijks de digitale nieuwsbrief van Park Lingezege ontvangen? In deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van alle belangrijke gebeurtenissen in Park Lingezege. Vul dan uw naam en e-mailadres in op: parklingezege.nl/nieuwsbrief.

Website

Onze website wordt dagelijks gevuld met alle actuele zaken die in Park Lingezege gebeuren. Nieuwsberichten, persberichten, evenementen, maar ook achtergrondinformatie over de ontwikkeling van Park Lingezege. U vindt er alle ontwerpen.

Bezoek de website op: www.parklingezege.nl

Facebook

Park Lingezege is ook op Facebook. Hiermee bereiken wij een doelgroep van omwonenden en andere betrokkenen bij Park Lingezege. We plaatsen dagelijks foto's, filmpjes en linkjes naar de website. Ook leggen we contacten met ondernemers in het gebied.

'Vind ons leuk' op Facebook: [facebook.com/parklingezege](https://www.facebook.com/parklingezege)

Twitter

Wij twitteren over alle werkzaamheden, evenementen en leuke nieuwtjes in Park Lingezege. We volgen daarbij mensen en ondernemers in het gebied. Via het twitterkanaal wordt u makkelijk naar nieuwe items op de website verwezen en volgt u ons live tijdens alle evenementen die komende tijd op het programma staan.

Volg ons op twitter: twitter.com/parklingezege en twitter zelf met #lingezege. Wij volgen u dan ook!

